

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20190920011015 Datum onderzoek: 20/09/2019 Agent: Nathan De Kegel niet-conform

ALGEMENE GEGEVENS

volgens TP01b

Plaats van onderzoek: Koning Albertlaan 15G, 9990 Maldegem (België)
 Opdrachtgever: Jan Francque - Sint-jansstraat 54, 9982 Sint-Jan-in-Eremo (België)
 Bedrijf: Francque J&J bvba Ond nr / IDnr: BE0818292691
 Eigenaar:
 Type lokalen: Woning
 Doel onderzoek: 271 - Controle onderzoek

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Zegel nr:		Continuïteitsmeting:	OK
Nominale spanning:	3 X 230V	ADS testknop:	NVT
Hoofdbeveiliging:	32A	ADS foutlus:	NVT
Voedingsleiding:	3 x 16 mm ² VOB	Bescherming RA OA:	OK
Elektrode type:	Aardingslus	R isolatie:	OK, > 0,5 M Ohm
Aantal borden:	1	R aarde:	6.34 Ohm
Aantal stroombanen:	4	Schema's:	niet OK
Waarde ADS:	300mA 40A	staat vast elektrisch materieel	OK



TOELICHTING

Teller exclusief nacht met verdeelbord voor elektrische verwarming. Door afwezigheid van de netspanning was het niet mogelijk de foutlus en/of testknop te testen. (Rapport 2 van 2)

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Schema	I	Eéndraad en/of situatieschema van de installatie te voorzien of te vervolledigen en/of in drievoud op te maken. Bij een volgende controle kunnen er inbreuken op dit punt worden vastgesteld.	16; 268; 269
2 Metingen	I	De isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5Mohm.	20
3 Verdeelbord	I	De aanduiding van de stroomkringen, apparatuur en/of de spanningsaanduiding, enz. is afwezig, onvolledig of onjuist	16; 252
4 Verdeelbord	I	De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd.	19; 49.01; 249


BESLUIT

De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 20/09/2020. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden. Alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Het is niet uitgesloten dat er bij herkeuring bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20190920011015 Datum onderzoek: 20/09/2019 Agent: Nathan De Kegel

niet-conform

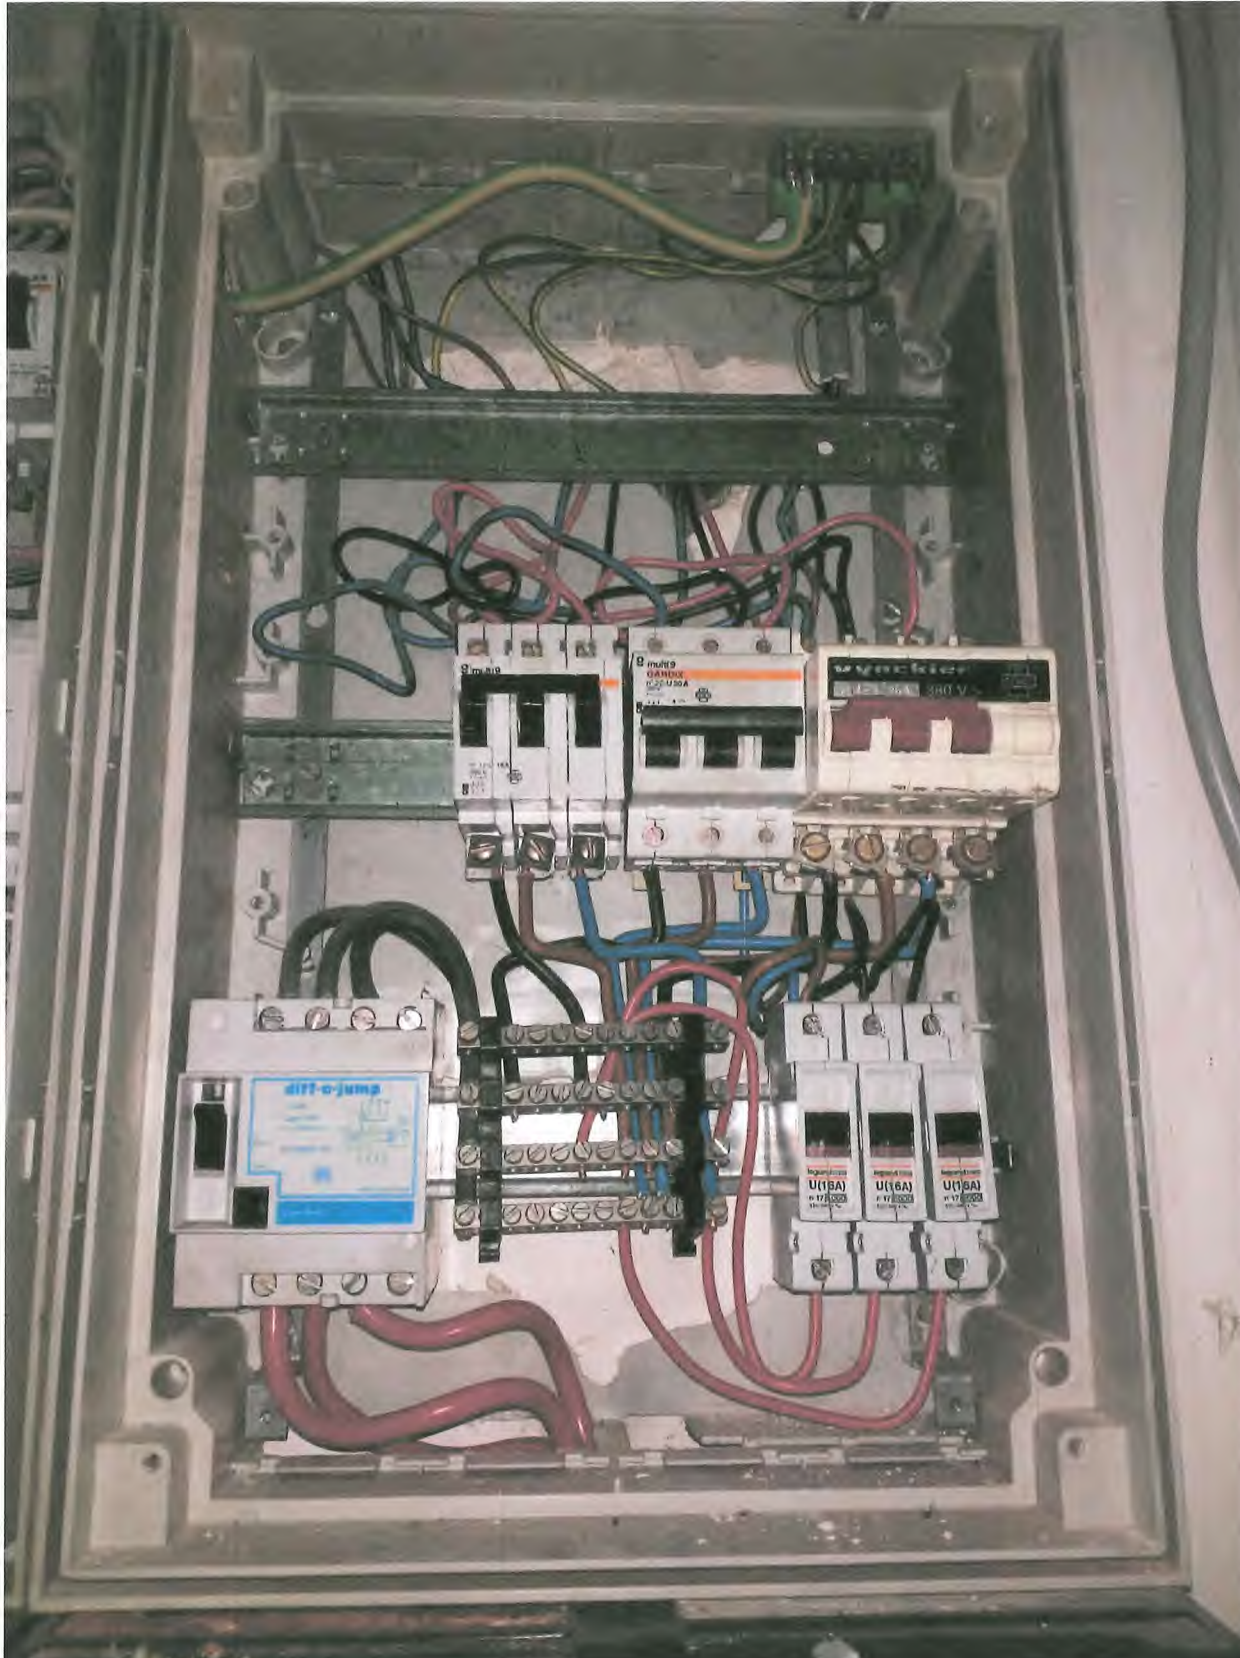



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002



526-INSP

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20190920011015 Datum onderzoek: 20/09/2019 Agent: Nathan De Kegel niet-conform

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Engergie in te lichten.

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Nathan De Kegel**

Datum vrijgave: 20/09/2019
